



Planta de Valorització Energètica

Informació de funcionament i procés

Gener 2022



1.

Dades de producció

	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Octubre	Nov.	Des.
Residus tractats (Tn)	30.840	28.135	9.406	29.381	31.015	30.140	31.669	28.360	27.273	30.753	29.702	30.817
Energia elèctrica generada (MWh)	19.083	16.173	3.066	15.480	18.876	17.925	18.405	16.776	15.905	18.034	16.501	17.732
Energia tèrmica generada (vapor a Districlima) (MWhe)	2.466	1.938	727	1.998	1.442	1.643	1.727	1.735	1.619	1.362	2.352	2.532



2.

Dades d'emissions

- ▶ Consulta les dades d'emissions mensuals [aquí](#).


2.2

Dades de consum

	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Set.	Octubre	Nov.	Des.
Urea additivada (Tn)	136,2	111,2	11,9	36,4	5,3	12,9	6,4	7,5	6,4	2,0	0,5	0,8
Hidroxid d'amoniac 25% (Tn)	0	0	5,2	24,9	49,6	50,1	56,2	49,3	44,3	53,2	50,5	54,5
Òxid de Calç (Tn)	214,0	195,9	63,3	232,6	256,8	251,7	273,9	305,2	263,2	252,6	260,4	284,4
Carbó actiu (Tn)	13,4	13,2	5,1	16,8	19,7	15,9	16,9	17,5	14,7	15,4	18,7	16,7
Gas natural (Nm3)	45.571	34.517	137.042	94.737	61.189	44.656	55.022	68.820	44.999	85.148	71.906	20.830
Aigua de xarxa (m3)	14.405	11.822	6.517	13.735	12.157	11.156	12.413	8.756	6.527	6.033	5.610	5.353

2.3

Fets rellevants

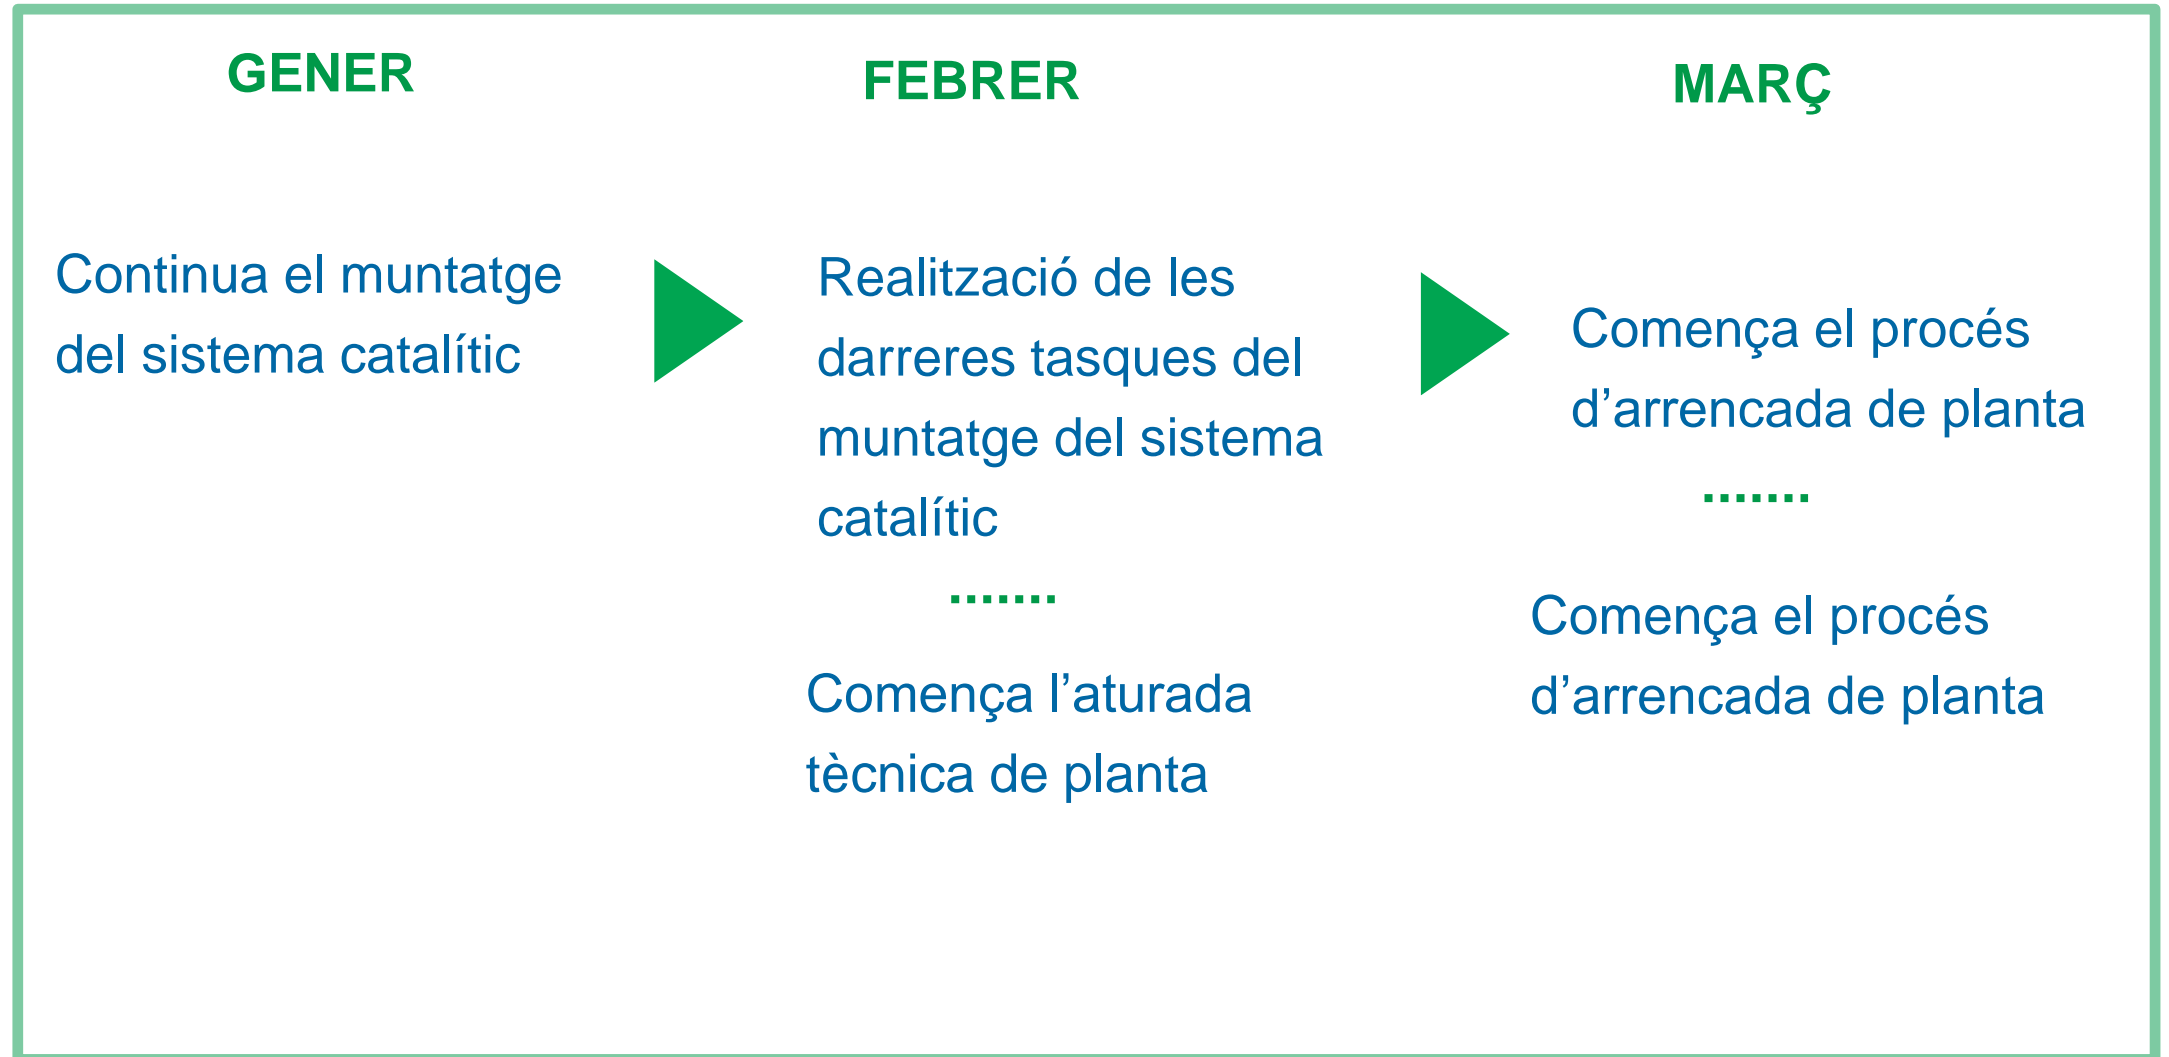

2.3

Fets rellevants

ABRIL

Segueix el procés de posada en marxa del sistema catalític



MAIG

Finalització de la posada en marxa del sistema catalític



JUNY

Comença el muntatge del nou sistema de filtratge de la dessaladora

2.3

Fets rellevants

JULIOL i AGOST

Segueix el procés de posada en marxa del nou sistema de filtratge de la dessaladora



SETEMBRE, OCTUBRE i NOVEMBRE

Tornen les visites a la PVE després de les restriccions derivades de la pandèmia de COVID-19

2.3

Fets rellevants

DESEMBRE

A conseqüència de l'empitjorament de la situació pandèmica a causa de la variant Òmicron, es tornen a restringir les visites a la planta.
